

## 附件 6.3 现场勘查记录

### 项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

#### 一、任命

现任命 李毅雄 同志，担任 云南煌璟商贸有限责任公司武陵  
县石料加工厂安全现状评价报告 项目组长。

#### 二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2024 年 5 月 30 日


#### 4 周边环境：

公司位于云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县营盘镇沧东村委会武陵邑，周边环境较简单，建设场地用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及基本农田、自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。周围无重要建筑设施和工业设施；无风景旅游点、学校、文物古迹和地质遗迹等重要工业设施。



5. 生产区域平面布置情况：原料堆场位于破碎站上方；办公室、值班室、配电房位于破碎站的东北方向、变压器位于破碎站的西北方向，破碎站设有机械设备安全防护罩、安全护栏等安全防护设施及注意安全、当心机械伤害等安全警示标识，均按规范要求布设；办公室及值班室位于原料堆场东侧 100m 处。

生产区域平面布置示意图

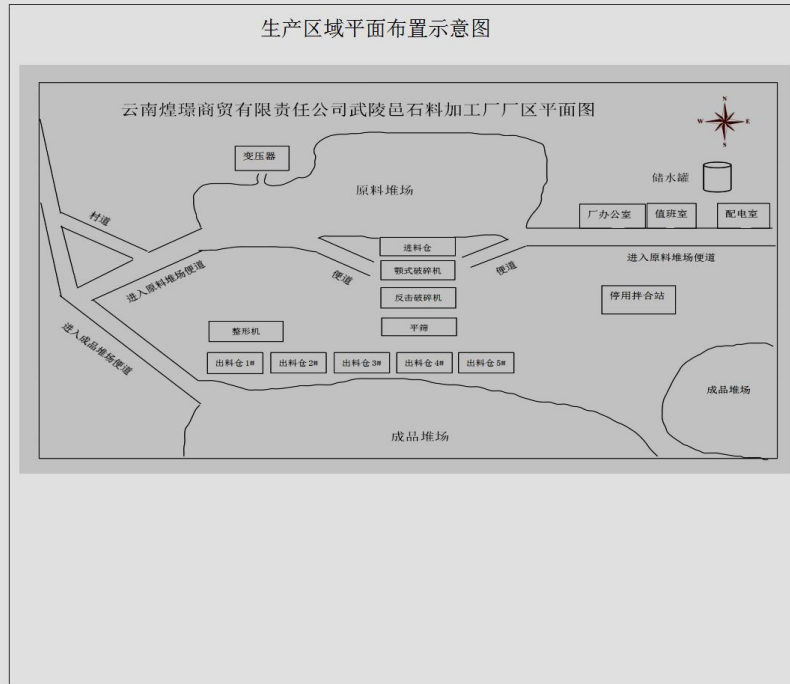

# 昭通市鼎安科技有限公司

## 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：云南煌璟商贸有限责任公司武陵邑石料加工厂

项目类型：安全现状评价

法定代表人（负责人）：宁永天

联系电话：13378881117

日期：2024.5.29

### 现场发现的问题及建议：

1. 厂区境界无防止人员和牲畜进入的措施。
2. 搅拌站已停用，无停用标志。
3. 配电室内缆线敷设不规范（敷设零乱），配电柜作业区未敷设绝缘垫，部分开关箱箱盖缺失，室内孔洞未封堵。
4. 破碎机最上面第一层操作平台临边防护栏无踢脚板，下面的操作平台无防护栏，破碎机裸露的转动部位无防护罩，未设置安全警示标志。
5. 巡检通道不规范，临边无防护，台阶未硬化，雨天人员易滑跌。
6. 矿运道路内侧无排水沟，危险路段无安全警示标识。
7. 原料仓隔墙无防撞措施。
8. 安全警示标志设置不足，如进入厂区入口处无限速标志、机械设备无“当心机械伤”、危险临边无“当心坠落”等安全警示标识。

委托方负责人：

现场检查人员：


昭通市鼎安科技有限公司

2024年5月29日

注：本建议书一式三份，请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认，本检查建议书将报送安全生产监督管理局。

## 安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: \_\_\_\_\_ 项目完成时间 \_\_\_\_\_ 年 月 日

机构名称	昭通市鼎安科技有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	云南煌璟商贸有限责任公司武陵邑石料加工厂安全现状评价报告	所在地区	兰坪县营盘镇	
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/>		现状评价 <input checked="" type="checkbox"/>	其他安全评价 <input type="checkbox"/>
项目审批机关	兰坪县		职工人数	7人
			销售额	
是否属跨省建设项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额	万
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别 (代码)				
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
李毅雄	0800000000205742		项目负责人、报告编制、现场勘查	
周忠菊	1100000000301644		项目成员、报告编制、现场勘查	
崔巍	0800000000304343		项目成员	
陈恭文	1500000000300447		项目成员	
毛卫旭	0800000000205718		项目成员	
评价人员是否到现场勘查		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项		8	提出隐患治理建议措施多少项	8
被评价单位意见和建议				

注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。

2. 要填写工整, 内容完整, 及时归档。
